


ONKOLOGIE -TERAPIE-AMBULANCE

G2

DETAIL  
REKO ENERGOCENTRUM  
1:400

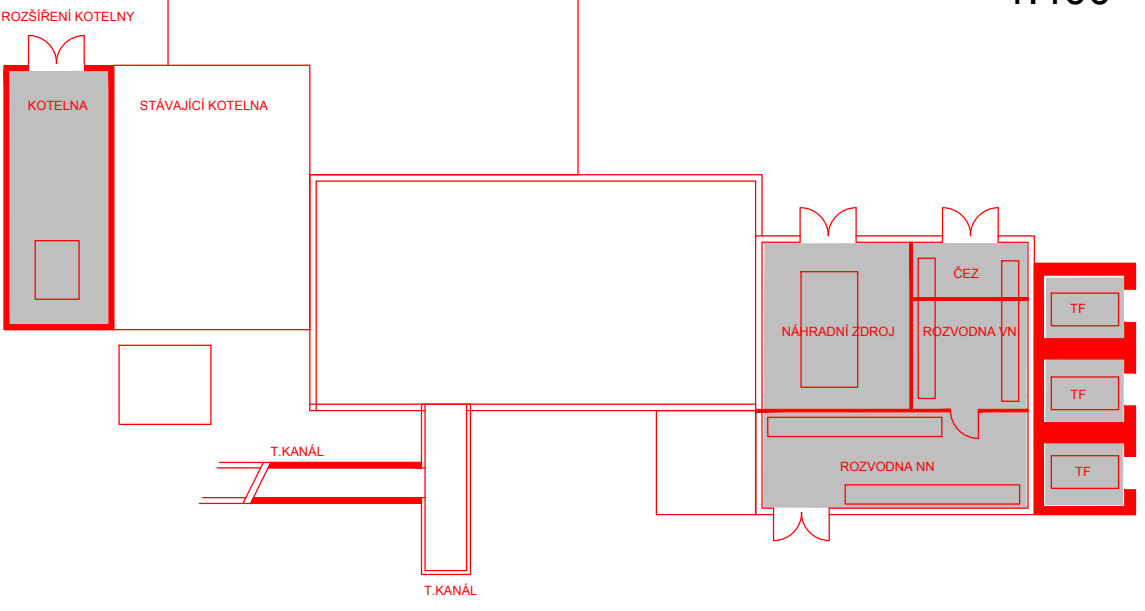

BODOVÝ POSTUP REKONSTRUKCE ENERGOCENTRA ZA PROVOZU.

- výstavba nových trafokobek
- postupné přemístění TR1 až TR3 do nových pozic, provizorní připojení z původní VN rozvodny a vývodů do původního NN rozvaděče
- vybudování nové rozvodny VN v uvolněném prostoru původních traf
- osazení nového VN rozvaděče, přepojení přípojky VN, přeložení přímých přívodů traf do finální pozice
- osazení externího mobilního DAG, odpojení stávajícího náhradního zdroje a úprva prostor nové strojovny náhradního zdroje
- kompletní osazení nové technologie NZ (DAG)
- postupná rekonstrukce, resp. nahrazení starého rozvaděče NN novým za plného provozu nemocnice. Osazení jedné části hlavního rozvaděče, postupné přepojení jednotlivých kabelů, demontáž uvolněného starého rozvaděče, osazení druhé části nového rozvaděče, přepojení zbývajících kabelů. Demontáž druhé části starého NN rozvaděče. Osazení třetí části nového NN rozvaděče.

DOTČENÉ ČÁSTI ENERGOCENTRA

- G 1 - TECHNICKÉ ZÁZEMÍ STROJOVNY, ZÁSOBOVÁNÍ
- G 2 - ONKOLOGIE, TERAPIE, AMBULANCE  
STACIONÁŘE
- G 3 - LINEÁRNÍ URÝCHLOVAČE

- LEGENDA:
- HLAVNÍ CHODBY
  - NOVÉ KONSTRUKCE
  - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Objednatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
Projektant: PENTA PROJEKT sro, Mířkova 12, 586 01 Jihlava  
2. PODZEMNÍ PODLAŽÍ

GENEREL KARLOVARSKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE  
1. ETAPA  
OBJEKT: G1/1, G1/2, G2, G3

02

1:200
