

ETAPA DIO 7:

V rámci této etapy dojde k uzavírce ulice Ašská ve směru od ulice Vodní po okružní křižovatku Pražská x Ašská x Evropská včetně vjezdu do ČSPHM. Dojde k odstranění vnitřního prstence okružní křižovatky, doplnění konstrukčních vrstev vozovky a vyfrézování stávající části vozovky ulice Ašská a položení asfaltových vrstev silnice. Zároveň bude v této etapě na ulici Ašská realizován středový ostrůvek. Zároveň dojde k uzavření ulice Pražská ve směru od okružní křižovatky Pražská x Ašská x Evropská směrem k ulici Májová. Vjezd a výjezd do ČSPHM bude zachován. Dojde k odstranění vnitřního prstence okružní křižovatky, doplnění konstrukčních vrstev vozovky, vyfrézování stávající části vozovky ulice Pražská a položení asfaltových vrstev silnice. Stávající okružní křižovatka bude v provozu jako okružní křižovatka za pomoci přechodného dopravního značení s doplněním provizorního VDZ.

Provoz pěších přes ulici Ašská a Pražská bude uzavřen a pěší trasa bude vedena v rámci okružní křižovatky. Objízdná trasa pro vozidla bude vedena ulicemi a ulicemi Ašská, Vodní, Havlíčkova, Smetanova, Májová, Pražská. Dále bude vedena objízdná trasa ulicemi Evropská, Pivovarská, Májová ve směru na ulici Májová.


Po dokončení prací bude realizováno nové VDZ a spuštěno SSZ, zároveň dojde k dobudování ostrůvku u ulice Pražská - rameno k ulici Májová (směrem do křižovatky).

U této etapy bude do doby nového VDZ v provozu stále okružní křižovatka za pomoci CITY blok, přechodného DZ atp...

LEGENDA PLOCH:


- PRÁCE NA SILNICI (UZAVÍRKA)
- POJÍZDNÝ KRYT BEZ VDZ
- VOZOVKA/CHODNÍK
- TRÁVNÍK

Objízdná trasa směr Cheb – okružní křižovatka Pražská x Ašská x Evropská:

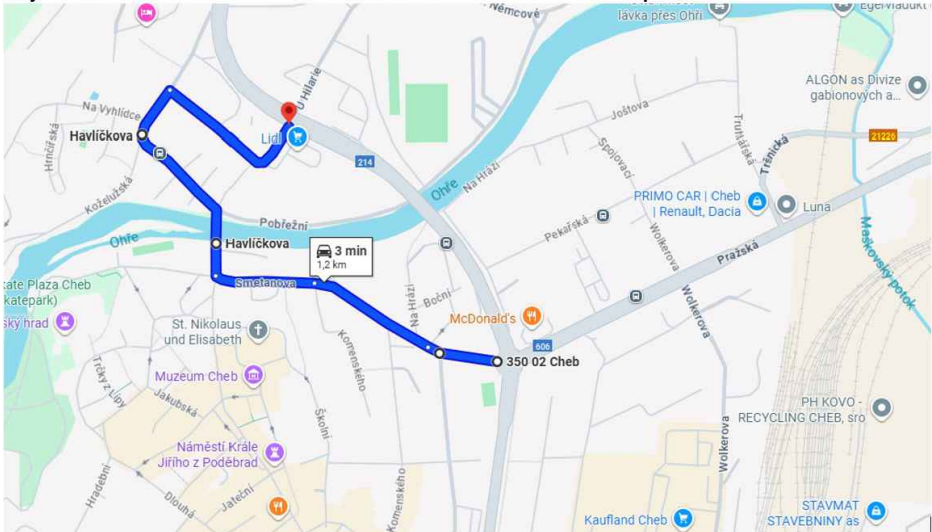

V rámci uzavírky bude uzavřena autobusová zastávka **Cheb, plynárna**, která bude přemístěna na zastávku **Cheb, Kasární náměstí**, která je v docházkové vzdálenosti cca 370 m (6 minut) – spoje viz DIO Va.

Objízdná trasa směr Májová:

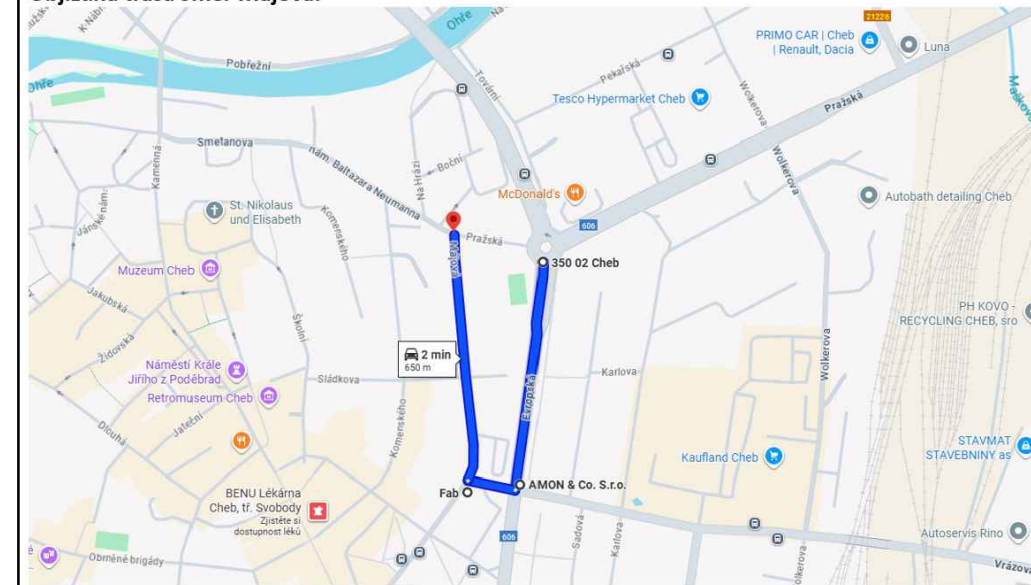

Žádná autobusová zastávka nebude omezena, autobusy budou vedeny po objíždce.
