

1. PP - SERVISNÍ OBJEKT

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
-N1.601	TZB, sklady	82,10	stěrka	
-N1.602	odpad	40,50	stěrka	
-N1.603a	sklad náhradních dílů	35,30	stěrka	
-N1.603b	lapol	8,80	stěrka	
-N1.604	dohledové centrum	17,70	stěrka	
-N1.605	soc. zázemí obsluhy	9,40	ker. dlažba	
-N1.606	šatna zaměstnanců	7,70	ker. dlažba	ker. obklad stěn
-N1.608	TZB, sklady	19,60	stěrka	
-N1.609	zásobovací chodba	64,90	stěrka	
-N1.610	násávací komora VZT	65,30		
-N1.611	instalační prostor VZT (SOZ)	29,00		

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
N - S3	únikové schodiště	13,40	stěrka	

OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
V6	nákladní výtah	4,70		

OZN. MÍST.	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI:	PLOCHA m²	POVRCH PODLAHY	POZNÁMKA
R101	šachta sací VZT a DA	7,20	nátěr na beton	
R102	šachta výfuk. VZT a DA	7,20	nátěr na beton	
R103	šachta VZT (pro servisní objekt)	1,00		
R104	šachta VZT (pro servisní objekt)	2,70		
R105	šachta VZT (pro servisní objekt)	0,70		

**POZNÁMKA**


- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- PODLAH. STĚRKA PRO VLHKÉ PROVOZY - VODOTĚSNÁ A V PROTISKLUZ. ÚPRÁVĚ, VE STROJOVNĚ DIESELAGREGÁTU ODOLNÁ ROPNÝM A OLEJ. LÁTKÁM

**ZNAČENÍ HMOT**

KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ (VIZ STATICKOU ČÁST)

STĚNY A PŘÍČKY Z BETON. TVÁRNIC

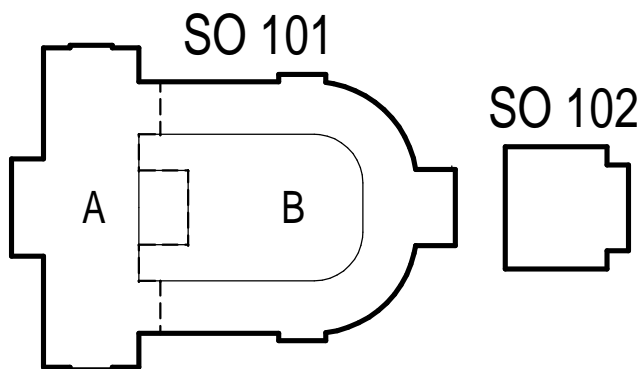

VEDOUcí TÝMU VYPRACOVAL	ING. ARCH. TOMÁŠ DOHNAL ING. MARIE NEPOŽITKOVÁ ING. JIŘÍ KOLANDA	<small>Ing. Jaroslav N. 192 21 192 Ing. Marie N. 192 21 192 Ing. Jiří K. 192 21 192</small>
INVESTOR	KARLOVSKÝ KRAJ Základní úřad 380 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAK.Č. AKCE 20080111-3
MÍSTO STAVBY	KARLOVSKÝ VÁŘY Karlovarská ul. č. 308 380 01 Karlovy Vary	STUPĚŇ PD DSP
AKCE:	KARLOVSKÝ VÁŘY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	DATUM 03 / 2010
VYKRES:	SO 102 - PŮDORYS 1.PP	PROFESSE ARCH
	MÉRITKO: 1 : 50	FORMÁT 10 x A4
	KOPIE:	SOUBOR
		Č. VÝKRESU: 02
