

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 488/ODO/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/VG/2021/037/VGHV

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 15/ZPR/2021

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. STRABAG a.s.

se sídlem Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Ing. Jitka Tesařová, ekonomka provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí provozní jednotky

Stavbyvedoucí – [REDACTED]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Autorizovaný technik v oboru
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Telefon: +420 [REDACTED]

Fax: +420 377 832 812

E-mail: [REDACTED]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, oddíl B
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 488/ODO/2021 (841/TD/VG/2021/037/VGHV) na veřejnou zakázku „**III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW**“ je změna stavbyvedoucího zhotovitele a dále tento dodatek č. 1 upravuje čl. IV odst. 4.1, kde dochází k upřesnění průběhu stavebních prací a k upřesnění předpokládaného termínu ukončení celé stavby s ohledem na zajištění finančních prostředků a navazujícího předání a převzetí staveniště a vyřešení odvozu nevhodných zemin ze stavby, což prodlužuje celkovou lhůtu pro dokončení díla dle stavebního deníku o 10 dní. Dále dochází v čl. V, odst. 5.1. k navýšení nákladů stavby z důvodu dodatečných stavebních prací na odvozu a uložení zemin, dále dle provedených protokolů a vyjádření AD dochází ke zlepšení aktivní zóny (AZ), kdy v souladu s § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, a čl. 5.2 této smlouvy, kde dochází k vypuštění věty o provedení a vyfakturování prací za rok 2021 z důvodu obdržení finančních prostředků až v roce 2022.

Smluvní strany

Původní znění:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Ing. Jitka Tesařová, ekonomka provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí provozní jednotky

Stavbyvedoucí – [REDAKCE]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

Telefon: +420 [REDAKCE]

Fax: +420 377 832 812

E-mail: [REDAKCE]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDAKCE]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, oddíl B *na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Nové znění:

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, vedoucí provozní jednotky

Ing. Jitka Tesařová, ekonomka provozní jednotky

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozní jednotky

Stavbyvedoucí – [REDAKCE]

Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

Telefon: +420 [REDAKCE]

Fax: +420 377 832 812

E-mail: [REDAKCE]

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744



Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, oddíl B na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální doba realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	do 31.07.2022 od předání a převzetí staveniště, vč. lhůty pro zajištění DIO a zimní přestávky

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště:	01.03.2022
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální doba realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	do 10.10.2022 od předání a převzetí staveniště, vč. lhůty pro zajištění DIO a vč. prodloužení na provedení dodatečných stavebních prací o 10 dní

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH

21 % DPH

Cena vč. DPH

11 903 918,27 Kč

2 499 822,84 Kč

14 403 741,11 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH

14 039 372,85 Kč

21 % DPH

2 948 268,30 Kč

Cena vč. DPH

16 987 641,15 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

5.2. Objednatel vypouští větu z odst. 5.2 a to ve znění: Pokud nedojde k jiné dohodě, musí zhotovitel v roce 2021 provést a vyfakturovat práce v minimální hodnotě 2 mil. Kč.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 488/ODO/2021, č. zhotovitele 841/TD/VG/2021/037/VGHV zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:

- 1) HMG stavby ze dne 02.03.2022
- 2) Rekapitulace soupisu prací

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace

za zhotovitele
Luboš Mengr
vedoucí provozní jednotky
zmocněn
STRABAG a.s.

Ing. Jitka Tesařová
ekonomka provozní jednotky
zmocněna
STRABAG a.s.





Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: TÚ_2021_026 III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW 11 903 918,27 14 039 372,85 2 135 454,58

Objekt:

Rožpočet:

Objekt	Popis	Celkem ZDS (SOD)	Celkem REALIZACE	ROZDÍL
1	2	3	4	5
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	496 029,93	496 029,93	0,00
101	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA	9 999 394,08	11 301 700,66	1 302 306,58
131	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	341 414,67	341 414,67	0,00
301	ODVODNĚNÍ ZPĚVNĚNÝCH PLOCH	1 067 079,59	1 900 227,59	833 148,00

MĚNĚ PRÁCE (-)		MĚNĚ PRÁCE (-)		
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	496 029,93	0,00	
101	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA	9 999 394,08	-562 763,92	
131	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	341 414,67	0,00	
301	ODVODNĚNÍ ZPĚVNĚNÝCH PLOCH	1 067 079,59	0,00	
	MĚNĚ PRÁCE (-) CELKEM	-562 763,92		
	ZMĚNA CENY DÍLA (-) MĚNĚ PRÁCE	11 341 154,35	-4,73%	

VÍCE PRÁCE (+)		VÍCE PRÁCE (+)		
000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	496 029,93	0,00	
101	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA	9 999 394,08	1 865 070,50	
131	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	341 414,67	0,00	
301	ODVODNĚNÍ ZPĚVNĚNÝCH PLOCH	1 067 079,59	833 148,00	
	VÍCE PRÁCE (+) CELKEM	2 698 218,50		
	ZMĚNA CENY DÍLA (+) VÍCE PRÁCE	14 602 136,77	22,67%	

STAVBA	Celkem ZDS (SOD)	MĚNĚ PRÁCE (-) A VÍCE PRÁCE (+) CELKEM	MĚNĚ PRÁCE (-) A VÍCE PRÁCE (+) V %
REKAPITULACE III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW	11 903 918,27 Kč	2 135 454,58 Kč	17,94%

STAVBA	Celkem ZDS (SOD)	ROZDÍL MĚNĚ/VÍCE PRÁCE	CELKEM REALIZACE
REKAPITULACE III/210 36 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW	11 903 918,27 Kč	2 135 454,58 Kč	14 039 372,85 Kč

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA BMW

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Před	Měsíce 2022																																
						IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI																									
1	ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	40 dny	21.03. 22	13.05. 22		21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31
2	DIO 1 ETAPA	69 dny?	01.04. 22	06.07. 22		[Gantt chart bars for DIO 1]																																
3	KOMUNIKACE	69 dny?	01.04. 22	06.07. 22		[Gantt chart bars for KOMUNIKACE]																																
4	HTÚ	21 dny	01.04. 22	29.04. 22		[Gantt chart bars for HTÚ]																																
5	FRÉZOVÁNÍ ASFALTU	1 den?	02.05. 22	02.05. 22	4	[Gantt chart bars for FRÉZOVÁNÍ ASFALTU]																																
6	SAMACE PODLOŽÍ - zlepšování	12 dny	03.05. 22	18.05. 22	5	[Gantt chart bars for SAMACE PODLOŽÍ - zlepšování]																																
7	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	4 dny	19.05. 22	24.05. 22	6	[Gantt chart bars for VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI]																																
8	POKLÁDKA OBRUB A DLÁŽDĚNÍ	15 dny	25.05. 22	14.06. 22	7	[Gantt chart bars for POKLÁDKA OBRUB A DLÁŽDĚNÍ]																																
9	ASFALTOVÉ BETONY	3 dny	15.06. 22	17.06. 22	8	[Gantt chart bars for ASFALTOVÉ BETONY]																																
10	DOSYPÁNÍ KRAJNIC A TERÉNI ÚPRAVY	13 dny	20.06. 22	06.07. 22	9	[Gantt chart bars for DOSYPÁNÍ KRAJNIC A TERÉNI ÚPRAVY]																																
11	DIO 2 ETAPA	61 dny?	07.07. 22	29.09. 22		[Gantt chart bars for DIO 2]																																
12	KOMUNIKACE	61 dny?	07.07. 22	29.09. 22	10	[Gantt chart bars for KOMUNIKACE]																																
13	HTÚ	19 dny	07.07. 22	02.08. 22	10	[Gantt chart bars for HTÚ]																																
14	FRÉZOVÁNÍ ASFALTU	1 den?	03.08. 22	03.08. 22	13	[Gantt chart bars for FRÉZOVÁNÍ ASFALTU]																																
15	SAMACE PODLOŽÍ	12 dny	04.08. 22	19.08. 22	14	[Gantt chart bars for SAMACE PODLOŽÍ]																																
16	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	5 dny	22.08. 22	26.08. 22	15	[Gantt chart bars for VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI]																																
17	POKLÁDKA OBRUB A DLÁŽDĚNÍ	18 dny	29.08. 22	21.09. 22	16	[Gantt chart bars for POKLÁDKA OBRUB A DLÁŽDĚNÍ]																																
18	ASFALTOVÉ BETONY	3 dny	22.09. 22	26.09. 22	17	[Gantt chart bars for ASFALTOVÉ BETONY]																																
19	DOSYPÁNÍ KRAJNIC A TERÉNI ÚPRAVY	2 dny	27.09. 22	28.09. 22	18	[Gantt chart bars for DOSYPÁNÍ KRAJNIC A TERÉNI ÚPRAVY]																																
20	VDZ	1 den	29.09. 22	29.09. 22	19	[Gantt chart bars for VDZ]																																

STRAB

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4,
IČ: 60838744
(553)

2.3.2022


Projekt: hmg ok BMW
Datum: 02.03. 22

Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
Souhm projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení			

DIO – k.ú.: HORNÍ NIVY
 Výstavba OK BMW – I. etapa

SOUHLASÍ ME DNĚ
 23. 2. 2022


Krajská správa
 Karlova
 příspěvková
 Sokolov, Chebs
 IČ: 70947023

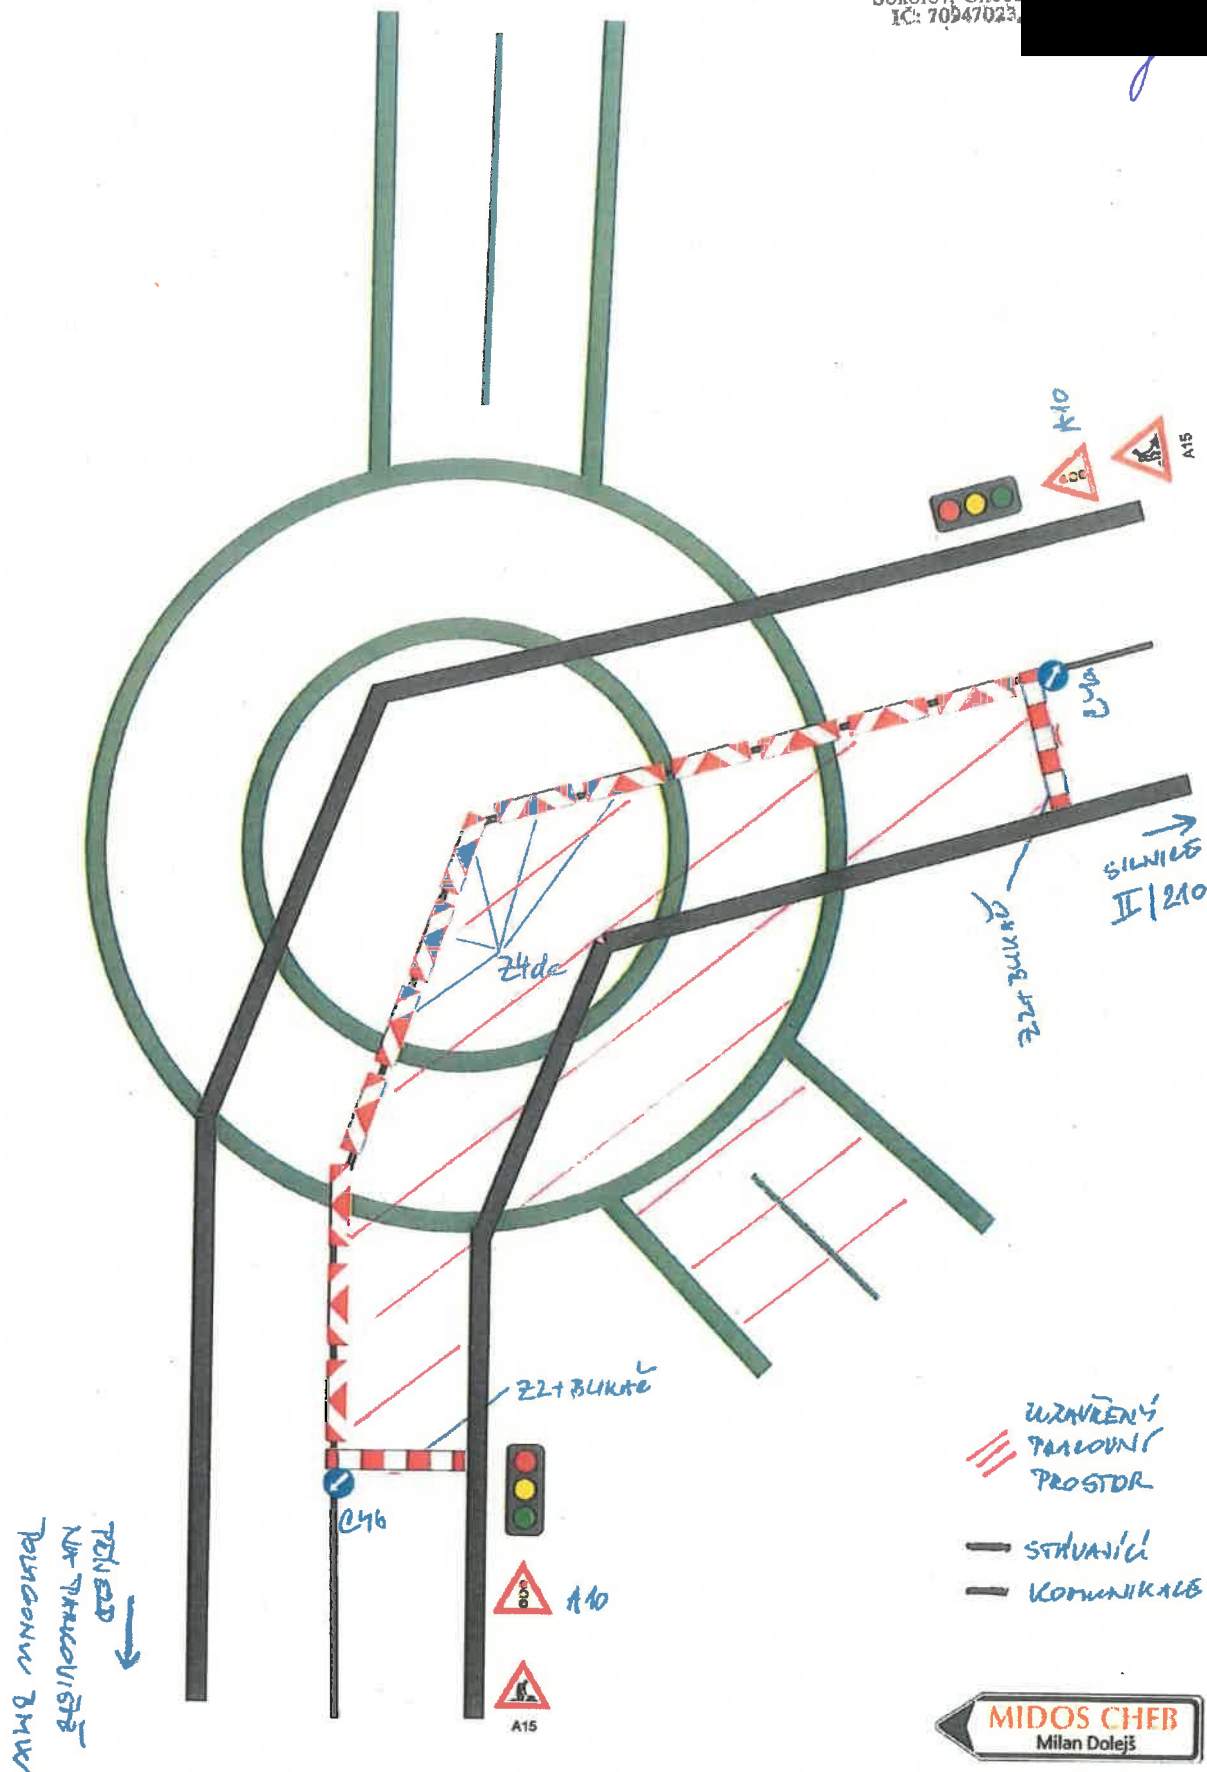

DIO – k.ú. Horní Nivý
 Výstavba OK BMW – II. etapa

SOUHLASÍME DNE
 23.2.2022

Krajská správa a údržba silnic
 Karlova
 příspěvková organizace
 Sokolov, Cheb
 IČ: 70947023

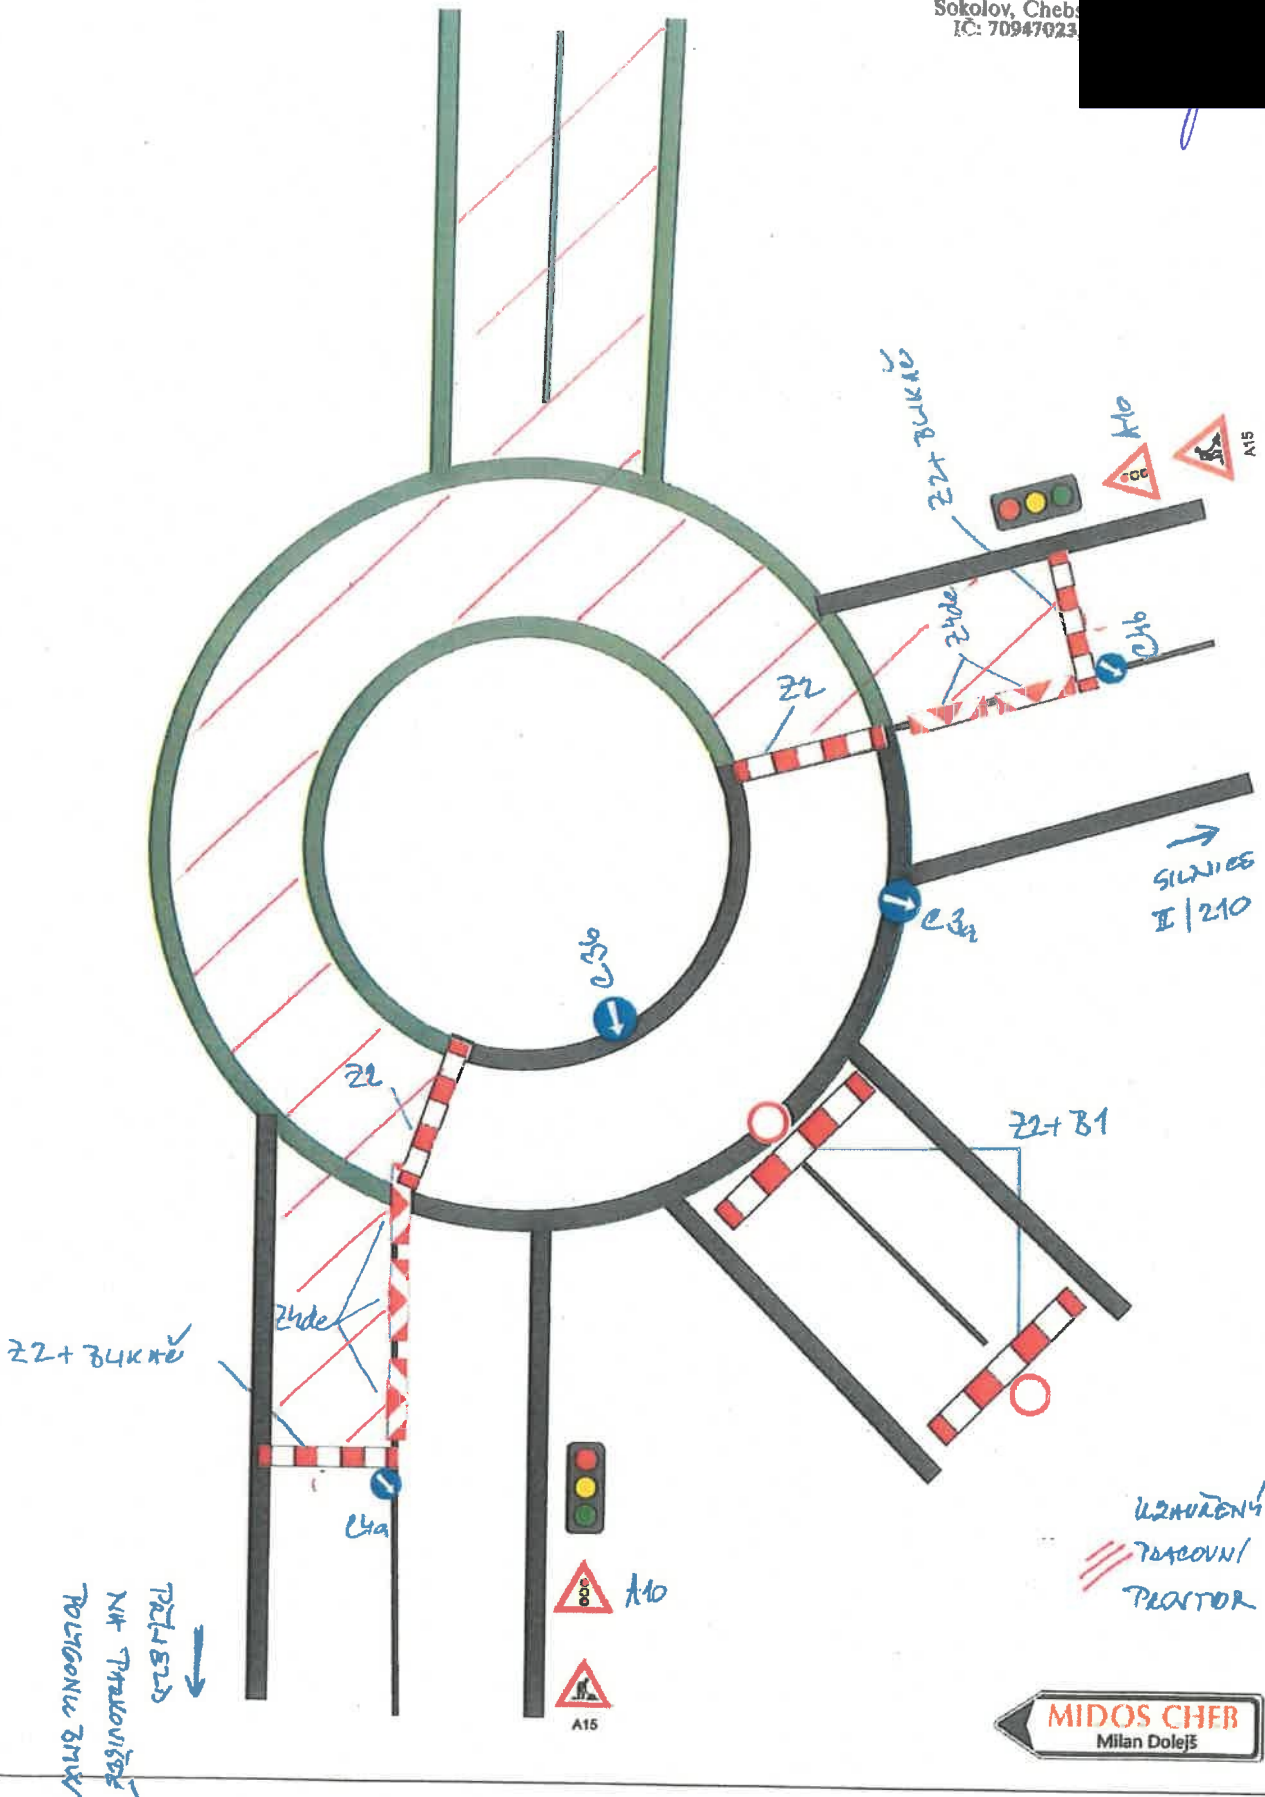

PRŮJEDNA
 NA PRACOVNÍ
 POLYGONU BMW
